

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Федерального казначейства


Р.Е. Артюхин

«10» _____ 2021 г.

Временный регламент осуществления управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации проверки отчетов о ходе реализации региональных проектов

I. Общие положения

1.1. Настоящий Временный регламент осуществления управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации проверки отчетов о ходе реализации региональных проектов (далее – Временный регламент) разработан в целях организации взаимодействия управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и проектных офисов субъектов Российской Федерации в соответствии с поручениями подгруппы «По обеспечению прослеживаемости хода реализации национальных проектов» межведомственной рабочей группы по мониторингу и контролю за эффективностью реализации национальных и федеральных проектов при президиуме Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам.

1.2. В целях настоящего Временного регламента применяются следующие сокращения и понятия:

ГИИС «Электронный бюджет» – государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

УФК – управление Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации;

РПО – проектный офис субъекта Российской Федерации (региональный проектный офис).

II. Осуществление проверки отчетов о ходе реализации региональных проектов

2. В целях проверки отчетов о ходе реализации региональных проектов необходимо:

2.1. Войти в подсистему бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет» и далее на рабочем столе выбрать «Меню»/«Подсистема управления национальными проектами»/«Паспорта проектов»/«Реестр отчетов о ходе реализации региональных проектов» (Рисунок 1).

Примечание: Выполняемое действие выделяется красной рамкой.

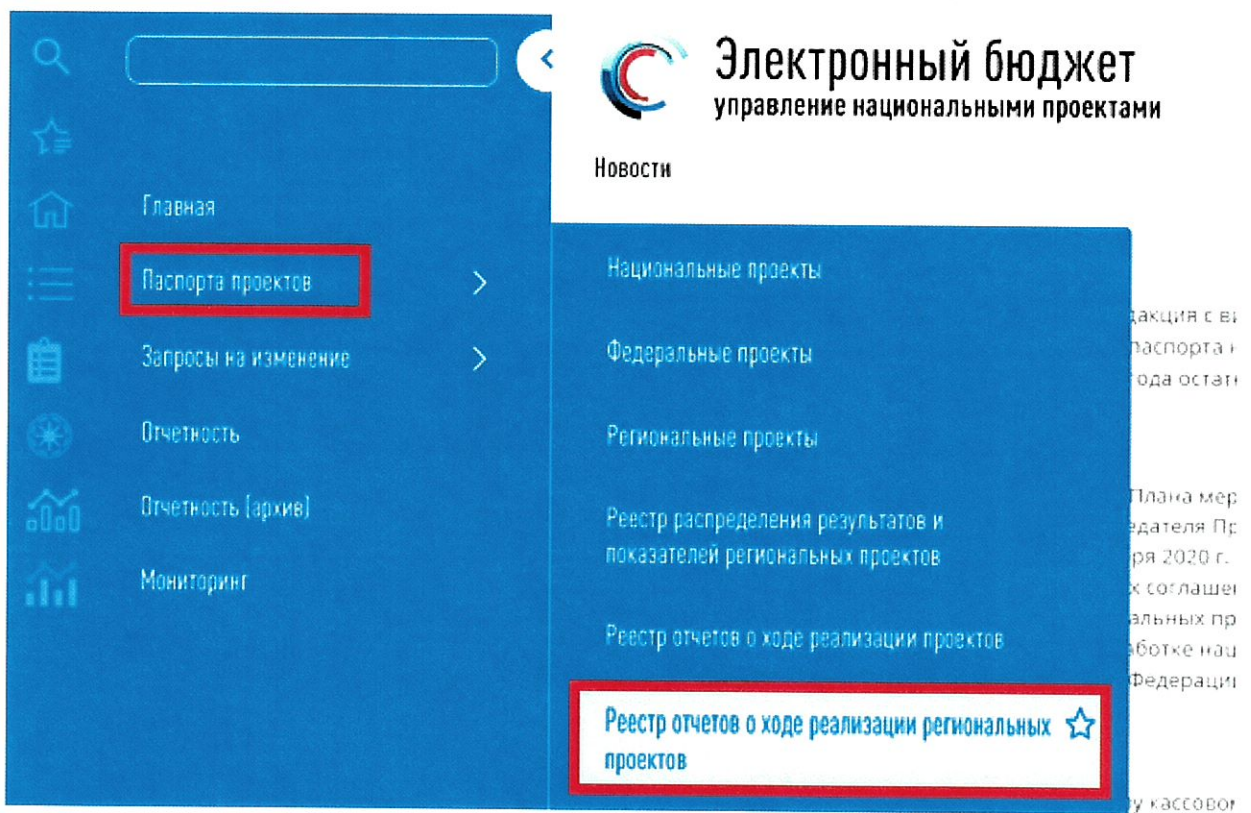


Рисунок 1. «Паспорта проектов»/«Реестр отчетов о ходе реализации региональных проектов»

2.2. В разделе «Реестр отчетов о ходе реализации региональных проектов» необходимо:

а) Выбрать отчет о ходе реализации регионального проекта (Рисунок 2).

Реестр отчетов о ходе реализации региональных проектов ×

2021

I квартал

Обновить | Перейти в отчет | Реестр согласования | Печать отчета

Код НП	Код	Субъект Наименование	Код проекта	Наименование	Номер отчета
P	22	Алтайский край	P5-01	Создание для всех категорий и групп насел...	P5.01-15-2021.01/4775
P	22	Алтайский край	P3-01	Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Алтайский край)	P3.01-15-2021.01/1396
N	22	Алтайский край	N1-01	Развитие системы оказания первичной мед...	N1.01-15-2021.01/3835

Рисунок 2. Реестр отчетов о ходе реализации региональных проектов.
Выбор отчета

б) Проверить статус отчета о ходе реализации регионального проекта (Рисунок 3).

Дальнейшая проверка осуществляется только в отношении отчетов о ходе реализации региональных проектов, имеющих статус «Утверждено» на этапе согласования «ПО».

Реестр отчетов о ходе реализации региональных проектов ×

2021

I квартал

Обновить | Перейти в отчет | Реестр согласования | Печать отчета

Код НП	Код	Субъект Наименование	Код проекта	Наименование	Номер отчета	Дата отчета	Период	Месяц	Тип отчета	Этап согласования	Статус согласования
N	22	Алтайский край	N5-01	Обеспечение медицинских организаций сис...	N5.01-15-2021.03/15	25.05.2021	Квартал	Март	Уточняющий	ПО	Утверждено
F	22	Алтайский край	F2-01	Формирование комфортной городской среды	F2.01-15-2021.03/44	11.05.2021	Квартал	Март	Уточняющий	ПО	Утверждено
F	22	Алтайский край	F2-01	Формирование комфортной городской среды	F2.01-15-2021.02/44	11.05.2021	Месяц	Февраль	Уточняющий	ПО	Утверждено
R	22	Алтайский край	R1-01	Дорожная сеть (Алтайский край)	R1.01-15-2021.03/48	11.05.2021	Квартал	Март	Уточняющий	ПО	Утверждено
R	22	Алтайский край	R1-01	Дорожная сеть (Алтайский край)	R1.01-15-2021.02/48	11.05.2021	Месяц	Февраль	Уточняющий	ПО	Утверждено
N	22	Алтайский край	N2-01	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	N2.01-15-2021.03/14	29.04.2021	Квартал	Март	Уточняющий	ПО	Утверждено
N	22	Алтайский край	N3-01	Борьба с онкологическими заболеваниями	N3.01-15-2021.03/14	29.04.2021	Квартал	Март	Уточняющий	ПО	Утверждено
N	22	Алтайский край	N4-01	Развитие детского здравоохранения, включ...	N4.01-15-2021.03/15	29.04.2021	Квартал	Март	Уточняющий	ПО	Утверждено

Рисунок 3. Реестр отчетов о ходе реализации региональных проектов.
Проверка статуса отчета.

в) Нажать «Перейти в отчет» для просмотра содержимого отчета о ходе реализации регионального проекта (Рисунок 4).

Реестр отчетов о ходе реализации региональных проектов ×

2021

квартал

Обновить **Перейти в отчет** → Реестр согласования Печать отчета

Код НП	Код	Субъект Наименование	Код проекта	Наименование	Номер отчета
Р	22	Алтайский край	P5-01	Создание для всех категорий и групп насел...	P5.01-15-2021.01/4775
Р	22	Алтайский край	P3-01	Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Алтайский край)	P3.01-15-2021.01/1396
N	22	Алтайский край	N1-01	Развитие системы оказания первичной мед...	N1.01-15-2021.01/3835

Рисунок 4. Реестр отчетов о ходе реализации региональных проектов.
Переход в отчет

2.3. В отчете о ходе реализации регионального проекта в разделе 5 «Сведения об исполнении бюджета» необходимо сравнить информацию о кассовом исполнении (графа «Кассовое исполнение») бюджета субъекта Российской Федерации (строка «бюджет субъекта, из них») с данными, имеющимися у УФК (Рисунок 5), в том числе:

- в автоматизированной системе Федерального казначейства;
- в Отчете об исполнении бюджета (ф. 0503117-НП) (графа «Исполнено») в части реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов).

Проверка считается пройденной, если указанная информация соответствует данным, имеющимся у УФК. В случае расхождения данных за счет округления до тыс. рублей (например, на 0,01 тыс. рублей) отклонение не фиксируется.

Обновить Детализация по КБК

Общие сведения	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.			Исполнение, тыс. руб.	
		Предусмотрено паспортом	СБР	ЛБО	Учитенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение
1 Ключевые риски	...					
2 Сведения о достижении по...	...					
3 Сведения об исполнении п...	привлеченные субъектом РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Сведения о достижении ре...	ОЗР: (01) Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода					
5 Сведения об исполнении бюджета	(02) Граждане старше трудоспособного в...	67 017,88	67 017,88	67 017,88	21 056,70	3 281,50
6 Сведения о ежемесячном ис...	консолидированный бюджет субъекта Росс	67 017,88	67 017,88	67 017,88	21 056,70	3 281,50
Сведения о реализации объе...	бюджет субъекта, из них	67 017,88	67 017,88	67 017,88	21 056,70	3 281,50
Значения результатов по мун...	межбюджетные трансферты, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	федеральному бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Рисунок 5. Отчет о ходе реализации регионального проекта. Раздел 5 «Сведения об исполнении бюджета» – графа «Кассовое исполнение»

Для просмотра информации о коде бюджетной классификации по результату необходимо выбрать строку «бюджет субъекта, из них» и перейти во вкладку «Детализация по КБК» (Рисунок 6).

Общие сведения	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.			Исполнение, тыс. руб.	
		Предусмотрено паспортом	СЕР	ЛБО	Учитенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение
Общий статус реализации
1 Ключевые риски
2 Сведения о достижении по
3 Сведения об исполнении п	привлеченные субъектом РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Сведения о достижении ре
5 Сведения об исполнении бюджета	ОЗР: (01) Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода
6 Сведения о помесечном ис	(02) Граждане старше трудоспособного в...	67 017,88	67 017,88	67 017,88	21 056,70	3 281,50
Сведения о реализации объе	консолидированный бюджет субъекта Росс	67 017,88	67 017,88	67 017,88	21 056,70	3 281,50
Значения результатов по мун	бюджет субъекта, из них	67 017,88	67 017,88	67 017,88	21 056,70	3 281,50
	межбюджетные трансферты из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	федеральному бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Рисунок 6. Отчет о ходе реализации регионального проекта. Раздел 5 «Сведения об исполнении бюджета» – вкладка «Детализация по КБК»

2.4. В отчете о ходе реализации регионального проекта в разделе 4 «Сведения о достижении результатов и контрольных точек» необходимо сравнить информацию, указанную в графах «Комментарий» и «Подтверждающие сведения» («Документ»), с информацией, указанной в графе «Наименование» (результата, контрольной точки) (Рисунок 7).

При необходимости следует раскрыть скрытый столбец «Подтверждающие сведения».

Проверка считается пройденной, если смысл информации, указанной в графе «Комментарий», и содержание документа, прикрепленного в поле «Подтверждающий документ», подтверждает выполнение контрольной точки, достижение результата соответственно.

Общие сведения	Наименование	Комментарий	Подтверждающ
Общий статус реализации	Документ
1 Ключевые риски
2 Сведения о достижении по
3 Сведения об исполнении п...
4 Сведения о достижении результатов и контрольных точек	Лица старше трудоспособного возраста у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением. Значения: 0,0000 Дата: 15.12.2021	В работе. Некорректное отображение результата. После изменения ошибка будет устранена. В соответствии с дополнительным соглашением от 03.12.2020 №149-2019-Р3022-1/4 плановое значение на 2020 год составляет 45,3%. Некорректное отображение результата. После изменения ошибка будет устранена. В соответствии с дополнительным соглашением от 03.12.2020 №149-2019-Р3022-1/4 плановое значение на 2021 год составляет 64,6%. Предоставлена информация: 0 из 0.	<p>Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края в Департамент организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации". Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края от 28.01.2021г. №21-14/ПМ3/31, приложен файл 2. "Приложение к отчету Министерства здравоохранения Алтайского края" Иное от 28.01.2021г. №61, приложен файл. Сформирован итоговый отчет за 2020 год.</p> <p>Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края в Департамент организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации</p> <p>Приложение к отчету Министерства здравоохранения Алтайского края</p>
5 Сведения об исполнении б...
6 Сведения о помесечном ис
Значения результатов по мун	Услуга оказана (работы выполнены)

Рисунок 7. Отчет о ходе реализации регионального проекта. Раздел 4 «Сведения о достижении результатов и контрольных точек»

В случае если в графе «Комментарий» указана информация по значению результата/контрольной точки «в работе» и отсутствует подтверждающий документ, отклонение не фиксируется.

При просмотре информации о выполнении контрольной точки по закупкам товаров, работ, услуг необходимо проверять наличие ссылки в графе «Подтверждающие сведения» («Ссылка») на единую информационную систему в сфере закупок (план-график закупок, извещение об осуществлении закупки, государственный (муниципальный) контракт).

2.5. В отчете о ходе реализации регионального проекта в разделе «Сведения о реализации объектов результатов» осуществляется проверка информации об объектах в следующем порядке:

а) В разделе 4 «Сведения о достижении результатов и контрольных точек» отчета о ходе реализации регионального проекта необходимо определить результаты с типом «Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества» и осуществить проверку наличия информации о данных результатах в разделе «Сведения о реализации объектов результатов» отчета о ходе реализации регионального проекта (Рисунок 8).

Проверка считается пройденной, если информация о результате с типом «Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества» отражена в разделе «Сведения о реализации объектов результатов».

При необходимости следует раскрыть недостающий столбец «Наименование».

Обновить

Общие сведения	Порядковый номер	Наименование	Результат	КТ значения результата
Общий статус реализации				
1 Ключевые риски				
2 Сведения о достижении по				
3 Сведения об исполнении п				
4 Сведения о достижении ре				
5 Сведения об исполнении б				
6 Сведения о ежемесячном ис...				
<input checked="" type="checkbox"/> Сведения о реализации объектов результатов				
Значения результатов по мун				
Задача: (01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от мес				
1		Создано новых мест в общеобразовательны...	Создано новых мест в общеобразовательны...	
1 K 1		Оборудование установлено	Создано новых мест в общеобразовательны...	Оборудование установлено
1 K 2		Объект недвижимого имущества введен в эк...	Создано новых мест в общеобразовательны...	Объект недвижимого имущества введен в эк...
1 K 3		В Приморском крае создано 250 новых мест	Создано новых мест в общеобразовательны...	В Приморском крае создано 250 новых мест.
1 4		Средняя общеобразовательная школа п. Во	Создано новых мест в общеобразовательны...	
1 4 K 1		Передача земельного участка подрядчику	Создано новых мест в общеобразовательны...	
1 4 K 2		Проведение аукционных процедур по заклю...	Создано новых мест в общеобразовательны...	
2		Создано новых мест в общеобразовательных организациях. Нарастающим итогом Значение 1 495,0000 Дата: 31.12.2022	Создано новых мест в общеобразовательных организациях. Нарастающим итогом	
2 K 1		Объект недвижимого имущества введен в эк...	Создано новых мест в общеобразовательны...	Объект недвижимого имущества введен в эк...
2 K 2		Объект недвижимого имущества введен в эк...	Создано новых мест в общеобразовательны...	Объект недвижимого имущества введен в эк...
2 K 3		Оборудование установлено	Создано новых мест в общеобразовательны...	Оборудование установлено
2 K 4		В Приморском крае созданы места в общеоб...	Создано новых мест в общеобразовательны...	В Приморском крае созданы места в общеоб...
2 5.		Объект капитального строительства Школа...	Создано новых мест в общеобразовательны...	

Рисунок 8. Отчет о ходе реализации регионального проекта. Раздел «Сведения о реализации объектов результатов»

б) При наступлении планового срока реализации объекта и (или) его контрольной точки (графа «Срок реализации» («План»)) необходимо сравнить информацию, указанную в графах «Вид и наименование документа» и «Комментарий», с информацией, указанной в графе «Наименование» (Рисунок 9).

Проверка считается пройденной, если смысл информации, указанной в графах «Вид и наименование документа» и «Комментарий», подтверждает реализацию объекта результата и (или) его контрольной точки.

Срок реализации		Информаци... система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
План	Факт/Прогноз			
15.05.2021	15.05.2021	ГИС "Элект...		В работе. в работе
31.03.2021	31.05.2021	ГИС "Электронный бюджет"	Письмо О направлении информации, Письмо О направлении информации, Письмо О замене объекта строительства	В работе. Наличие некритических отклонений. Просрочка 61 дней Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерство образования Приморского края от 08.02.2021г. №11/1574, приложен файл. 2. "О направлении информации" Письмо Министерство образования Приморского края от 15.03.2021г. №11/2969, приложен файл. 3. "О замене объекта строительства" Письмо Министерство образования Приморского края от 11.02.2021г. №АН-258/09, приложен файл. В связи со сменой объекта строительства работа по школе в п. Волчанец прекращена. Письмо о замене объекта строительства На № 11/1574 от 9 февраля 2020 г. Выбраны два новых объекта строительства. «Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» (плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – 31 декабря 2021 г.) и «Средняя общеобразовательная школа на 80 мест в с. Светлая Тернейского муниципального района» (плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – 31 декабря 2022 г.)

Рисунок 9. Отчет о ходе реализации регионального проекта. Раздел «Сведения о реализации объектов результатов» – подтверждение реализации объекта

2.6. Проверка отчетов о ходе реализации региональных проектов осуществляется УФК ежемесячно. По итогам проверки УФК и РПО заполняют отчетную форму (Приложение № 1 к настоящему Временному регламенту) в соответствии с Инструкцией по заполнению отчетной формы по проверке отчетов о ходе реализации региональных проектов (Приложение № 2 к настоящему Временному регламенту).

Заполненная отчетная форма направляется УФК в РПО не позднее 13 рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

РПО не позднее 4 рабочих дней со дня получения от УФК отчетности направляет заполненную отчетную форму в УФК с указанием кодов причин появления отклонений (Приложение № 3 к настоящему Временному регламенту), выявленных УФК.

УФК не позднее следующего рабочего дня со дня получения заполненной отчетной формы от РПО направляет ее в центральный аппарат Федерального казначейства посредством ЗКВС Outlook контактными лицам Управления бюджетного мониторинга Федерального казначейства.
